

令和 7 年 10 月 7 日
教育振興部学校施設課

練馬区立上石神井小学校および上石神井中学校
校舎等改築スケジュール等の変更について

1 状況


練馬区立上石神井小学校および上石神井中学校は、校舎等改築に向け令和 6 年 9 月から事業を進めてきたが、工事期間中の仮設運動場の確保を図るため、以下のとおり改築スケジュール等を変更する。

2 変更点

	変更前	変更後
仮設校舎工事着手	令和 9 年 4 月	令和 8 年 11 月
仮設校舎へ引越し	令和 9 年 12 月	令和 9 年 8 月
既存校舎解体工事着手	令和 10 年 1 月	令和 9 年 9 月
新校舎工事着手	令和 10 年 7 月	令和 10 年 3 月
新校舎へ引越し	令和 12 年 8 月	令和 12 年 12 月
運動場整備工事完了	令和 14 年 6 月	令和 15 年 9 月
新校舎建設中の仮設運動 場面積	1,800m ²	3,800m ²
仮設校舎棟数	2 棟	1 棟

3 工事スケジュール
添付のとおり

■ 工事ステップ図

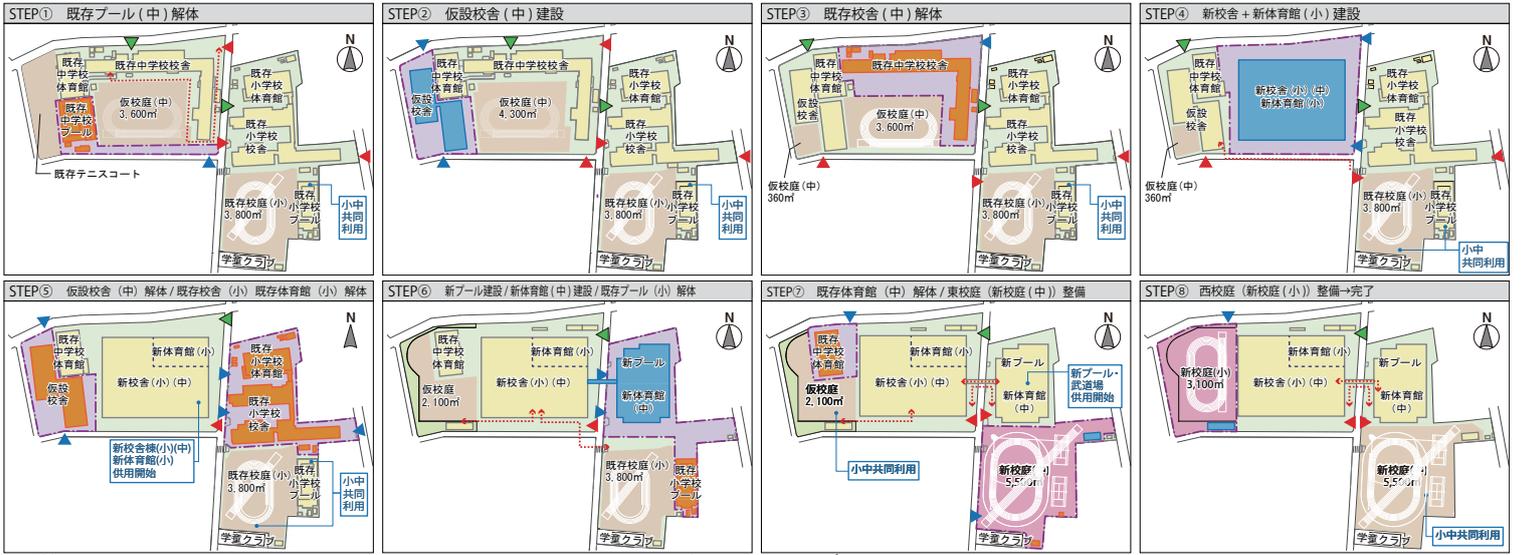

■ 事業工程表

年	令和8年			令和9年			令和10年			令和11年			令和12年			令和13年			令和14年			令和15年																				
年度	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			令和13年度			令和14年度			令和15年度																				
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
工事ステップ	STEP1			STEP2			STEP3			STEP4			STEP5			STEP6			STEP7			STEP8																				
仮設				(中) 仮設校舎建設・9か月			(中) 仮設校舎利用期間・40か月						(中) 仮設解体・6か月																													
校舎				(中) プール解体・5か月			(中) 校舎解体・8か月															(中) 体育館解体・5か月																				
体育館										(小・中) 校舎(小) 体育館建設・33か月																																
外構																(小) 校庭整備1・5か月						(小) 校庭整備2・6か月																				
仮設																																										
校舎																						(小) プール解体・5か月																				
体育館																						(中) 体育館・格技室(小・中) プール建設・19か月																				
外構																						(中) 校庭整備・10か月																				
